


輪島港 施設の復旧の見通し(目標)

令和6年12月23日時点

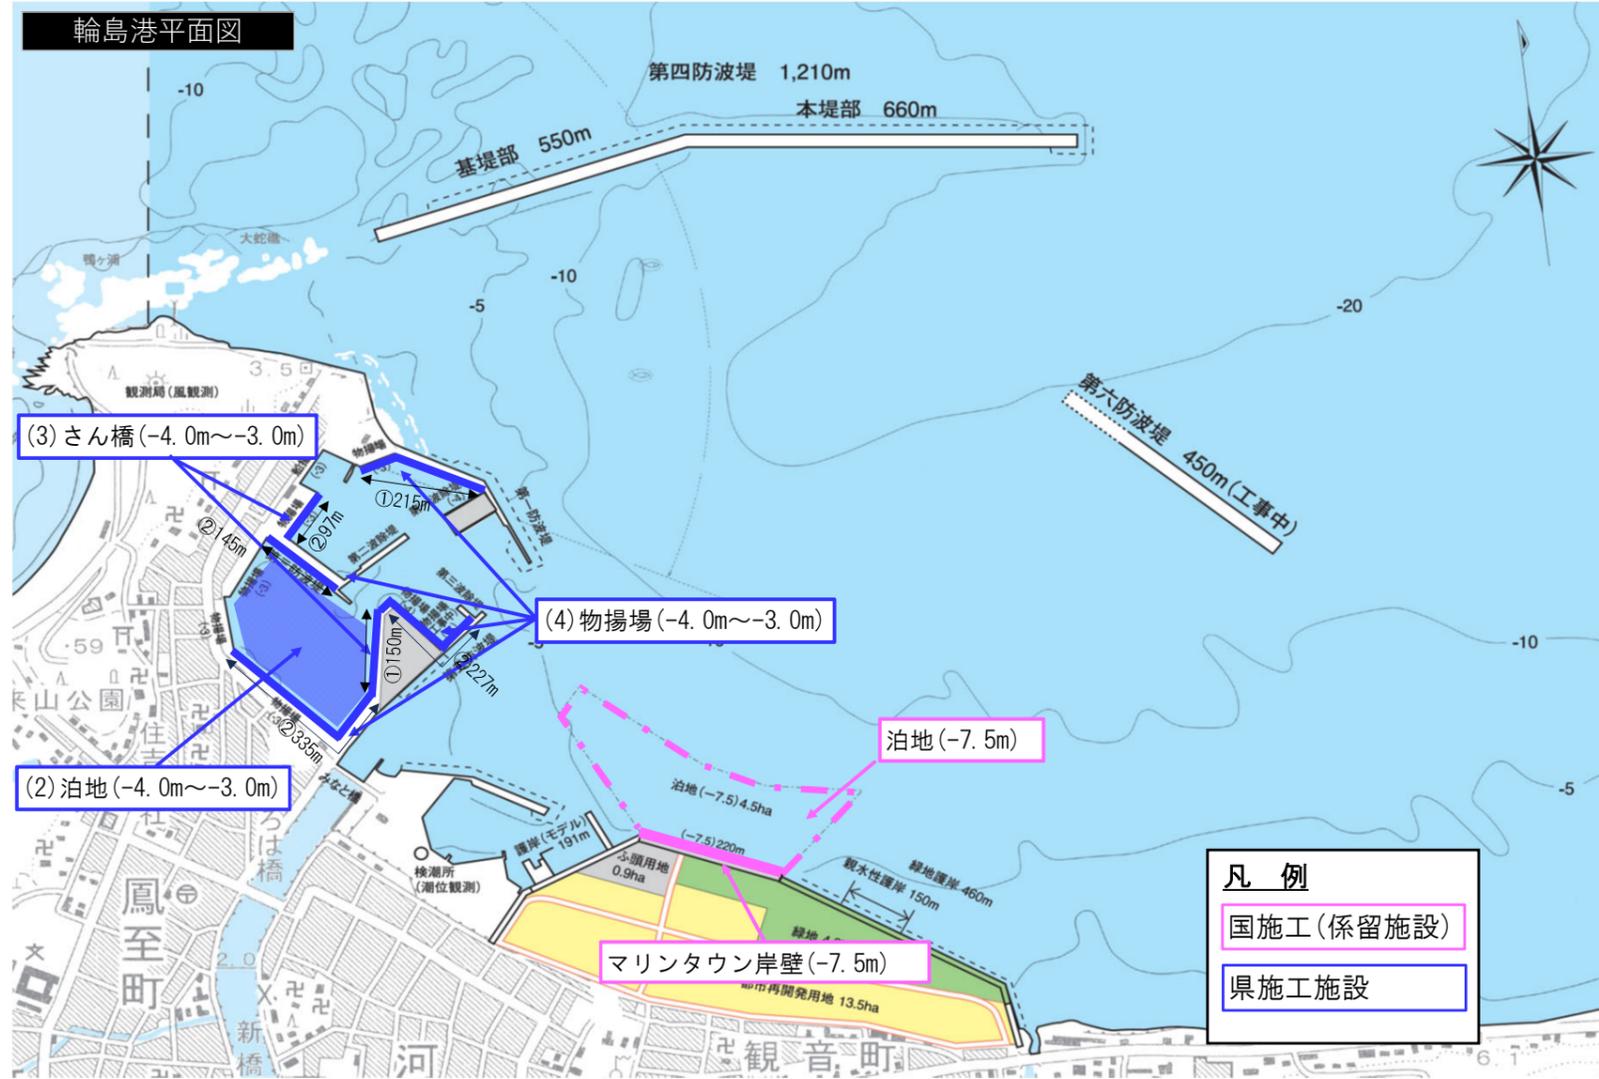

- 本年7月に、「輪島港復旧・復興プラン検討会」において策定した「短期の復旧方針」に基づき、マリンタウンの岸壁(-7.5m)及び泊地(-7.5m)は、原位置で復旧工事を進めることとしている。
- 当面、マリンタウン岸壁は暫定利用しつつ、令和7年4月～6月頃より泊地(沖側)の浚渫工事を行う。
- 泊地(沖側)の浚渫完了後、令和7年7月～9月頃よりマリンタウン岸壁の復旧工事を行う。
- 令和8年4月～6月頃より泊地(岸壁側)の浚渫工事を行う。
- 令和8年7月～9月頃よりマリンタウン岸壁を暫定供用、令和8年10月～12月頃、マリンタウン岸壁の供用を目指す。

施設名等	現状	復旧の見通し(目標)
【国施工(係留施設)】 (1)マリンタウン岸壁	制限付き暫定利用可 令和7年7月～9月頃まで	令和8年7月～9月頃(暫定供用:水深6m) 令和8年10月～12月頃(全延長供用)
【県施工施設】 (2)泊地(-4.0m~-3.0m) 82,000㎡	—	令和7年1月～3月頃
(3)さん橋(-4.0m~-3.0m) ①150m ②97m	暫定利用可	①令和7年5月～7月頃(段階的に復旧) ②令和7年8月～10月頃
(4)物揚場(-4.0m~-3.0m) ①215m ②707m	暫定利用可	①令和7年5月～7月頃(段階的に復旧) ②令和7年8月～10月頃(段階的に復旧)

※本資料は、現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事等の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。
