# 小木港　施設の復旧の見通し（目標）

令和6年12月23日時点

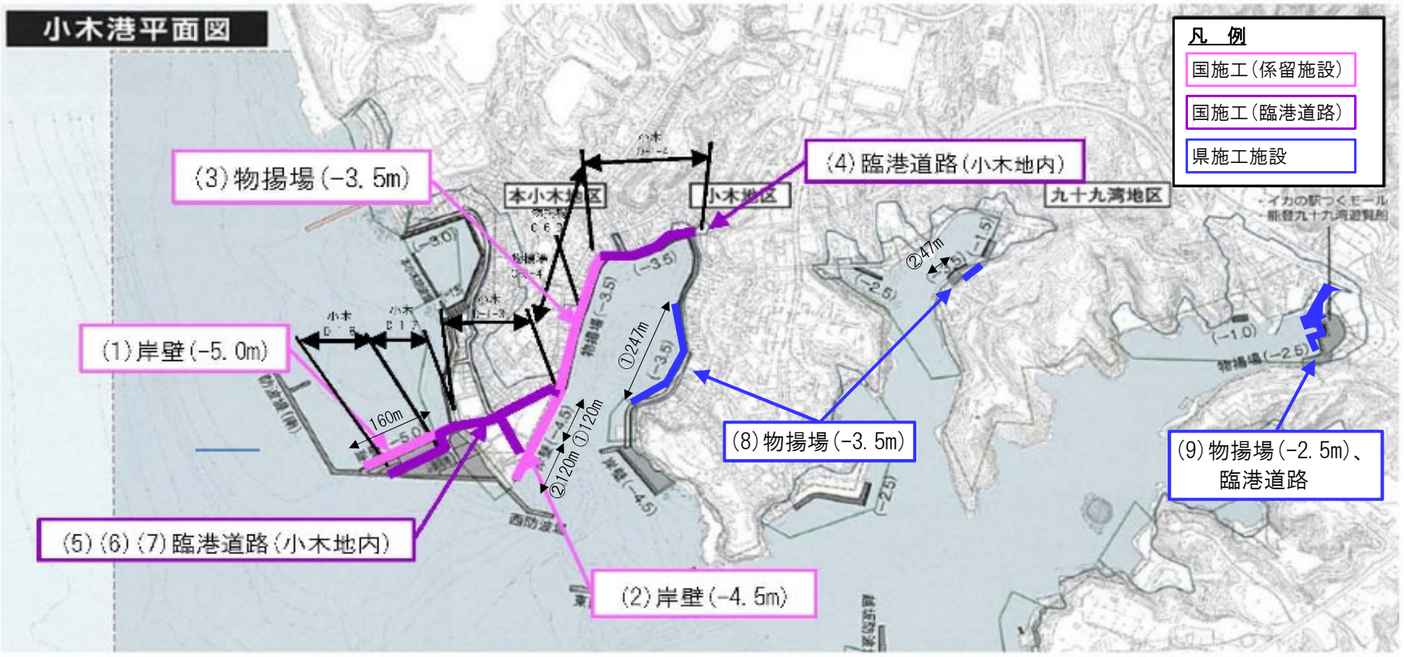


○ 当面、令和7年1月～3月頃から、岸壁(-4.5m)の一部②120m及び岸壁（-5.0m）の復旧工事を行う。

○ 岸壁(-4.5m)②120m部分供用後、残り①120mの復旧工事を行う。

○ 令和7年4月～6月頃から、物揚場（-3.5m）の復旧工事を行う。

○ 令和7年7月～9月頃、岸壁（-4.5m）の全延長供用を目指す。
○ 令和8年1月～3月頃、岸壁（-5.0m）、物揚場(-3.5m)の全延長供用を目指す。

○ なお、岸壁(-4.5m)の②120mの部分供用は令和7年4月～6月頃を目指す。

| 施設名等 | 現状 | 復旧の見通し（目標） |
|---|---|---|
| 【国施工(係留施設)】<br>(1)岸壁(-5.0m) 160m | 一部暫定利用可<br>（令和6年12月頃まで　90m） | **令和8年1月～3月頃　（全延長供用）** |
| (2)岸壁(-4.5m) 240m | 制限付き暫定利用可<br>（令和6年12月頃まで　240m）<br>（令和7年1月～3月頃まで　①120m）<br>１）岸壁前面水深が最大1m程度浅くなっている状況 | 令和7年4月～6月頃　（②120m　部分供用）<br>**令和7年7月～9月頃　（全延長供用）** |
| (3)物揚場(-3.5m) 300m | 一部暫定利用可 | **令和8年1月～3月頃　（全延長供用）** |
| 【国施工(臨港道路)】<br>(4)臨港道路(小木地内)　6.0×285m<br>(5)臨港道路(小木地内)　5.5×207.7m<br>(6)臨港道路(小木地内)　6.0×117m<br>(7)臨港道路(小木地内)　6.0×199.6m | ― | **令和8年1月～3月頃　（供用）** |
| 【県施工施設】<br>(8)物揚場(-3.5m) ①247m ②47m | ①暫定利用可<br>②利用不可 | ①令和8年1月～3月頃（段階的に復旧）<br>**②令和7年7月～9月頃** |
| (9)物揚場(-2.5m) 116m<br>臨港道路 76m | 利用不可 | **令和7年10月～12月頃（段階的に復旧）** |

※本資料は、現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事等の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。
